

NIGER PROJET KALLO TCHIDANIWO A DIFFA 2017 - 2021


MOTS CLES: Construction, Coexistence Pacifique, Logements Sociaux, Résilience, Accès à l'Eau, Transition au Développement.

SOMMAIRE DU PROJET

Le Projet Kallo TCHIDANIWO est mis en œuvre conjointement par le HCR et les autorités du Niger. Il est orienté vers la résilience institutionnelle et communautaire. Il vise à :

- appuyer les communes à forte concentration de population à réaliser des projets de lotissement pour assurer l'accès au foncier et à l'eau;
- assurer l'accès aux logements sociaux pour 4,000 ménages;
- utiliser le secteur de la construction pour créer des opportunités d'emploi pour les communautés
- renforcer les capacités des communes leur permettant ainsi de réaliser des investissements via la mobilisation de ressources internes issues de la vente des parcelles.

COÛT DU PROJET URBANISATION	 12.95 million EUR Financé Par: Union Européenne 	
BENEFICAIRES DU PROJET	650,000 habitants dont 315,000 en situation de déplacement (Réfugiés, IDPs, Retournés)	
LOCALISATION DU PROJET	7 communes Chetimari, Diffa, Guesskerou, Maine-Soroa, N'Guigmi, Kablewa, Toumour.	
PARTENAIRES	ANCSB, APBE, CISP, COOPI, Autorités Nigériennes.	
SOUS-PARTENAIRES	Consortium Shimodu	
POPULATION CIBLEE	25,200 personnes bénéficiant d'une parcelle, d'un logement social et de l'accès à l'eau; 42,000 personnes ayant accès au foncier pour le logement et à l'eau potable;	
HABITATS ET INFRASTRUCTURES	7 d'infrastructures d'accès à l'eau à construire ou à améliorer; 3,600 maisons à construire	
EXPERIENCES ACQUISES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expérimentation de la technique de construction ISSB (Interlocking Stabilized Soil Blocks) dans la région de Diffa. 2. Mise en œuvre des activités du Consortium sur le site de Diffa permet d'accélérer l'installation des ménages bénéficiaires sur les sites. 3. Lotissement et vente de parcelles au profit des communes. 4. Opérationnalisation du Nexus Humanitaire-Développement. 	



- 1** 30 Avril 2018: Formation des 40 premiers jeunes de Diffa dans la technique de fabrication des briques ISSB.
- 2** Juin 2018 Construction de 10 maisons témoins
- 3** Mai 2020 Demande d'extension du projet de plus d'une année
- 4** Juin - Juillet 2020 Attaques sur les infrastructures hydrauliques à Assaga

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS DU PROJET

- + Opportunités d'emploi aux jeunes (environ 1,212) pour réduire l'attrait vers les groupes armés.
- + Vente des parcelles ouvrant ainsi la voie à des opportunités pour les projets d'investissements des communes.
- + Synergie avec les partenaires de développement.
- + Opérationnalisation du nexus humanitaire-développement à travers le partenariat avec le Consortium Résilience Diffa EUTF.


DÉFIS LIÉS À LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

- Difficulté d'accès à certaines communes et sites de construction (Toumour) en raison de l'insécurité.
- Occupation prolongée du site de Diffa par les populations de N'Guagam (environ 230 ménages) suite à des attaques provoquant l'occupation anarchique du site de Diffa.
- Difficulté dans le ciblage occasionnant l'inoccupation des maisons.

NIGER PROJET KALLO TCHIDANIWO A DIFFA 2017 - 2021

Progrès par rapport aux objectifs


3,289 maisons construites et entamées (au 31 Mai 2021).
3,177 terminées et 112 en cours de construction).
358 en projection pour la suite de la période d'extension.

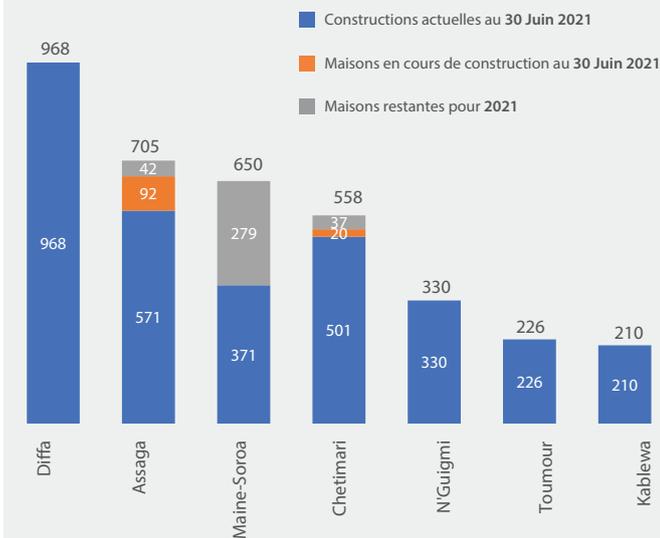

Infrastructures d'accès d'eau construites ou réhabilitées

Cible du Projet: **7**
Réalisé au 31 Octobre 2020 : **5** (Diffa, Assaga, Chetimari, N'Guigmi et Maine Soroa)
Perspective au 30 Juin 2021 : **2** (Toumour et Kablewa)


4,000 parcelles disponibles sur **6,000**.

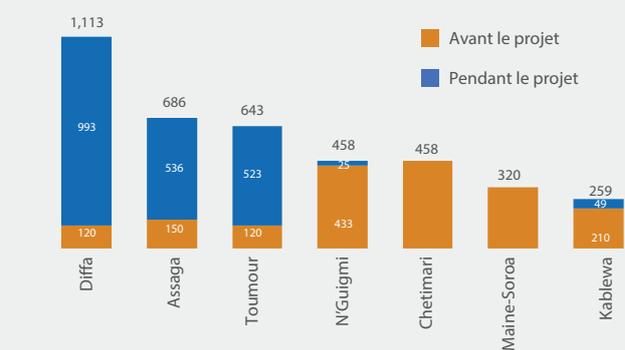

Finalisation des travaux en cours

- 100 ha à Maine-Soroa ;
- 100 ha à Chetimari


50,263 personnes ayant un accès amélioré à l'eau

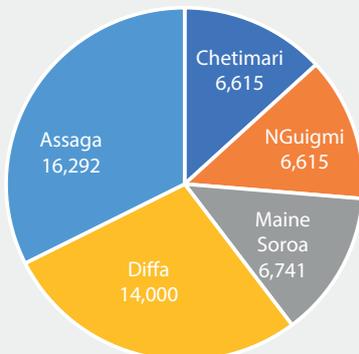

* L'infrastructure d'Assaga a été vandalisée en août 2020


5,811 emplois cumulés sur les chantiers dont **1,508** en 2021. **2,065** emplois ont été prévus par le projet.

Aucun nouvel emploi durant le mois de Juin 2021.

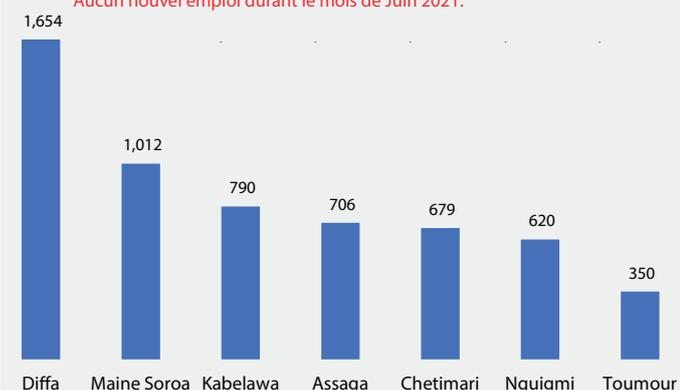

29 membres de CAEUC formés et soutenus pour la gestion des enjeux d'urbanisation.

2,576 personnes formées à la construction selon l'approche ISSB (715) et sans bois (1,861).


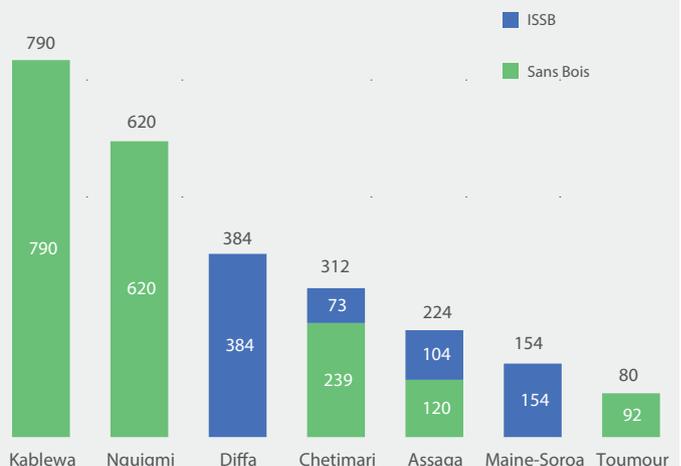


CAEUC: Comité d'Aménagement de l'Espace Urbain Communal ; ISSB: Interlocking Stabilized Soil Blocks

Aucune personne formée durant le mois de Juin 2021.

La Sous-Délégation du HCR à Diffa tient à remercier chaleureusement l'Union Européenne, les autorités Nigériennes ainsi que tous ses partenaires pour leur engagement à la réussite de ce projet.


Statut des bénéficiaires par commune (Décembre 2020)

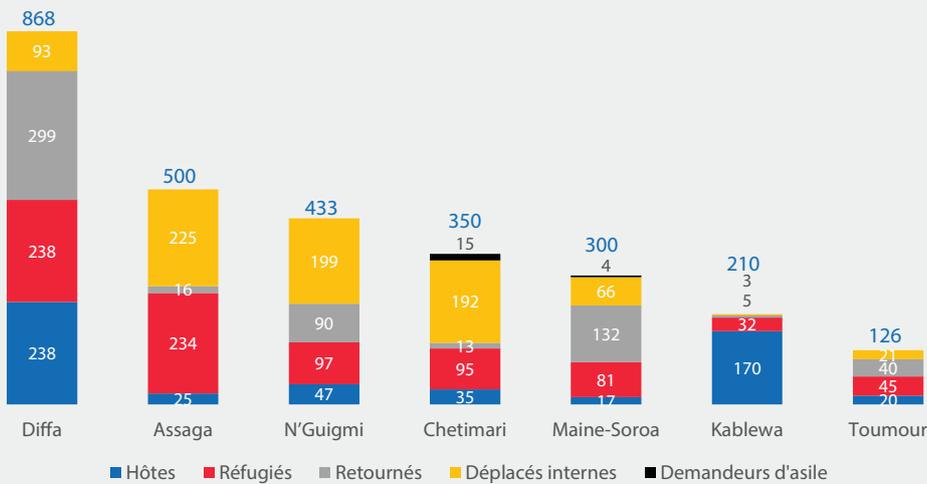

Vérifications conjointes physiques des bénéficiaires en instance à Kablewa, Toumour et Nguigmi.


Niveau d'occupation des maisons par commune (Taux d'occupation: 80%, Février 2021)

La mise à jour des taux d'occupation des logements sociaux se poursuivent de façon régulière sur l'ensemble des sites.

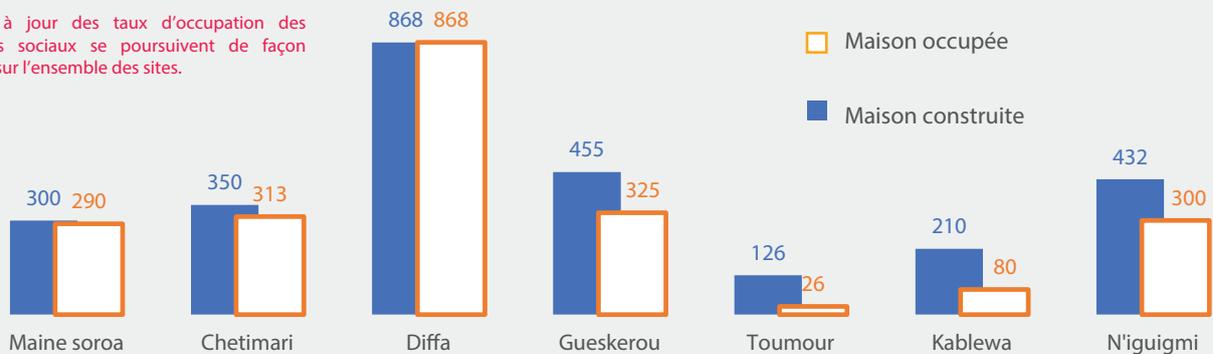


Commune de Diffa

Top 5 des origines des réfugiés installés à Diffa




Top 5 des origines des déplacés internes installés à Diffa




Commune de Maine-Soroa

Top 5 des origines des réfugiés installés à Maine Soroa



Top 5 des origines des déplacés internes installés à Maine Soroa



La Sous-Délégation du HCR à Diffa tient à remercier chaleureusement l'Union Européenne, les autorités Nigériennes ainsi que tous ses partenaires pour leur engagement à la réussite de ce projet.
